



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**  
**Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento**

OGGETTO:

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL  
POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO SITO  
IN VIA MACCACARO, S.N.  
PARERE ANTINCENDIO N. 11685  
ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011**

**PROGETTO ESECUTIVO**

TAVOLA:	TITOLO ELABORATO:  <b>ELABORATI ECONOMICI</b> <b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	
Nome file:	8.6 - Cronoprogramma dei lavori.doc	Scala:

B					
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO

Il Progettista:

Il RUP:

Il R.T.S.A.:




GEOM. CALOGERO CAPRARO

ING. ALESSANDRO DINOLFO

Visti ed approvazioni:

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N. ord.	Fase	Attività	Durata gg.
<b>1) FORMAZIONE CANTIERE</b>			15
1	F1a	Recinzione aree esterne	8
2	F1b	Montaggio box	10
3	F1c	Impianto elettrico	5
<b>2) OPERE EDILIZIE PIANO SEMINTERRATO</b>			44
4	F2a	Formazione riserva idrica antincendio	10
5	F2b	Piastra e recinzione G.E.	8
6	F2c	Piastra e recinzione gruppo pressurizzazione	15
7	F2d	Rimozione e collocazione infissi REI	8
8	F2e	Compartimentazione zona RX	6
9	F2f	Compartimentazione CSM	10
10	F2g	Compartimentazione scala protetta	20
<b>3) OPERE EDILIZIE PIANO TERRA</b>			52
11	F3a	Rimozione e collocazione infissi REI	5
12	F3b	Compartimentazione aree lato destro	10
13	F3c	Compartimentazione corridoi e controsoffitto	11
14	F3d	Compartimentazione aree lato sinistro	12
15	F3e	Compartimentazione scala protetta principale	10
16	F3f	Lavori in copertura	11
17	F3g	Infissi vie di fuga	4
<b>4) OPERE EDILIZIE PIANO PRIMO</b>			20
18	F4a	Rimozione e collocazione infissi REI	6
19	F4b	Infissi REI ascensori	4
20	F4c	Compartimentazione aree lato sinistro	5
21	F4d	Compartimentazione aree lato destro	5
22	F4e	Compartimentazione corridoi e controsoffitto	6
<b>5) IMPIANTO IDRANTI</b>			33
23	F5a	Formazione condotta di adduzione	8
24	F5b	Formazione anello esterno di distribuzione idranti	10

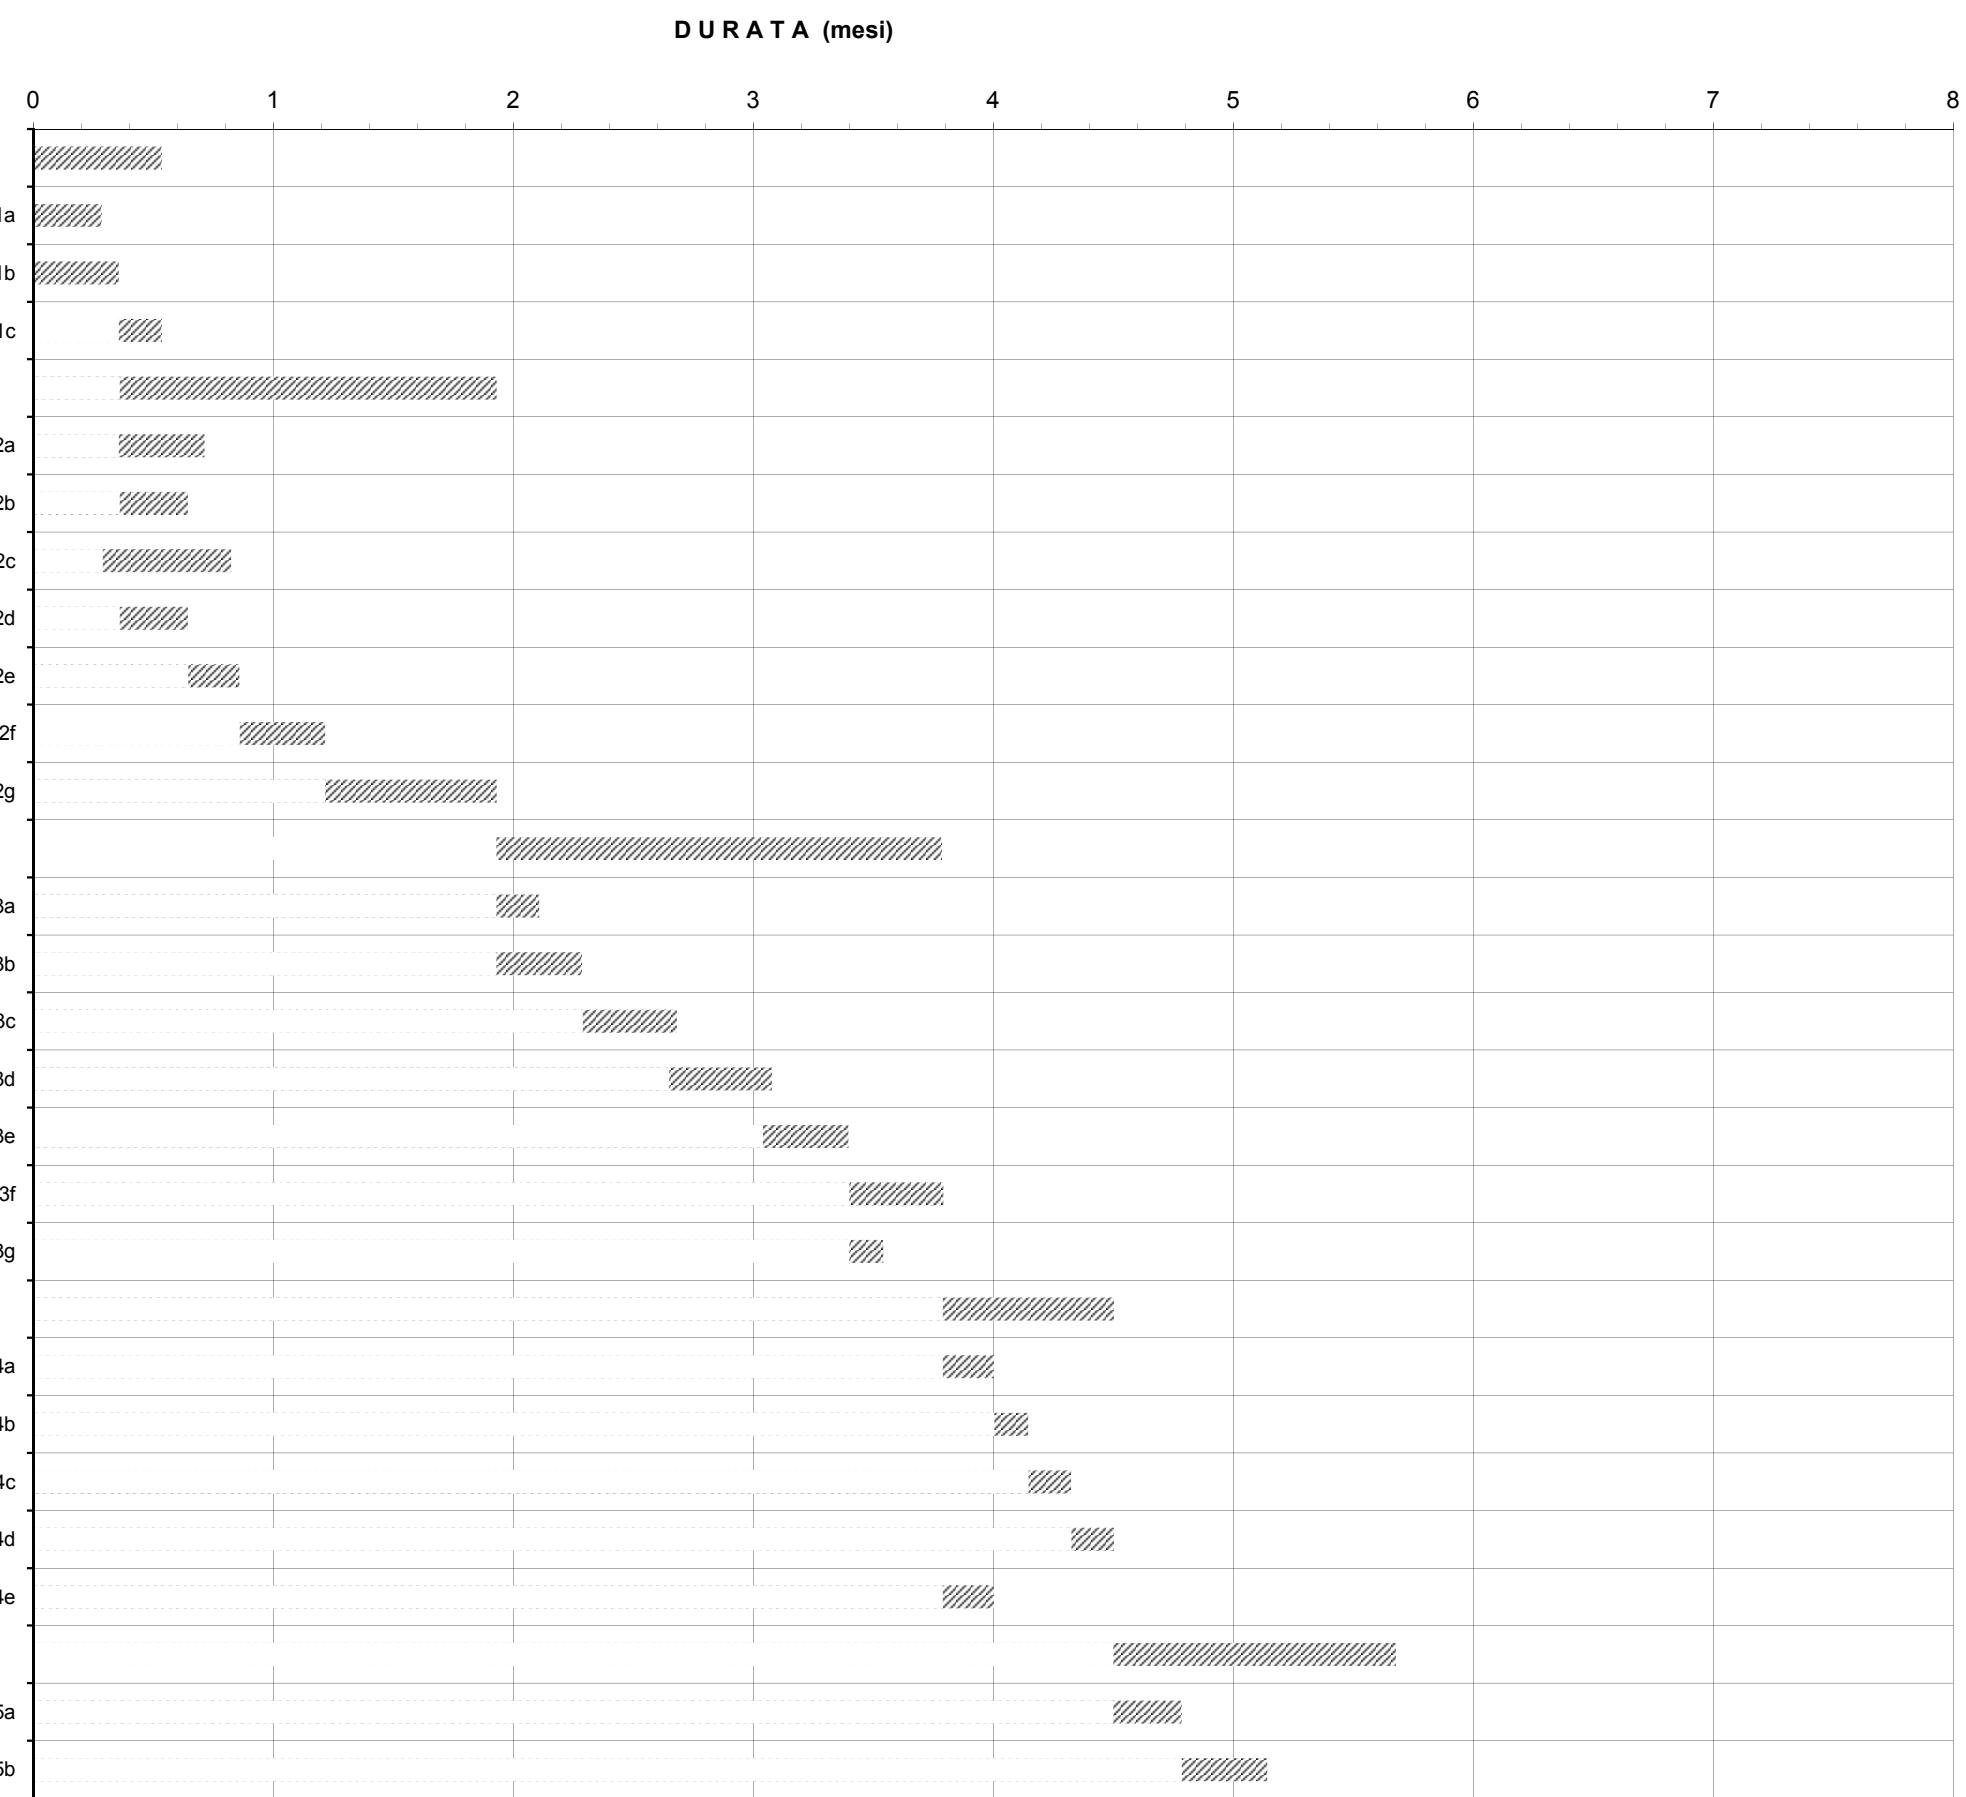

25	F5c	Installazione gruppo pressurizzazione e apparati	6
26	F5d	Formazione derivazioni piano seminterrato	5
27	F5e	Formazione derivazioni piano terra	5
28	F5f	Formazione derivazioni piano primo	6
<b>6) IMPIANTO ALLARME INCENDI</b>			24
29	F6a	Verifica funzionalità elementi esistenti	5
30	F6b	Installazione e cablaggio impianto piano primo	6
31	F6c	Installazione e cablaggio impianto piano seminterrato	6
32	F6d	Installazione e cablaggio impianto piano terra	6
33	F6e	Installazione centrale, cablaggi e attivazione	8
<b>7) IMPIANTO ELETTRICO</b>			10
34	F7a	Adeguamento quadro generale	4
35	F7b	Posa e cablaggio circuiti in progetto	6
36	F7c	Installazione e cablaggio quadro QLA	3
37	F7d	Connessione impianto di terra e verifiche	4
38	F8	<b>Smobilizzo cantiere</b>	4
<b>Tempo esecuzione lavori</b>			
<b>7 mesi/ 200 giorni</b>			

