


ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 960 DEL 22 NOV. 2024

**OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI LICATA. APPROVAZIONE
ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA - CUP
C62C21001960006.**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 858 DEL 24/10/2024

II R.U.P.

Assistente Tecnico
geom. Mario Micciché

IL DIRIGENTE AMM.VO

dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Spinella Denaro Rosa

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Ernesto Sferlazzo

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

☒ C.E.

☐ C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Dr. Domenico Salvo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19 NOV. 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTIQUATTRE del mese di NOVEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024 acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA PINOVE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- nell'ambito del superiore Programma, la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;
- con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la *governance* del PNRR sono state previste misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- con Decreto 15 settembre 2021 il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stata istituita l'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR;
- con Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della salute pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2022 recante "*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)*" sono state determinate le risorse a valere sul PNRR e a valere sul PNC e ripartite a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome;

ACCERTATA dall'esame del predetto D.M. 20 gennaio 2022 l'assegnazione in favore della Regione Siciliana (Soggetto Attuatore) della somma complessiva di €. 796.573.463,33;

EVIDENZIATO che la Regione Siciliana ha elaborato la programmazione del POR Sicilia correlandola all'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto;

CONSIDERATO che:

- il predetto POR è stato sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana;
- con D.A. n. 406 del 26/05/2022, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana e, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, l'Assessore della Salute ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, che, tra l'altro, comprende le 59 Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 "Case della Comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità";

- n. 21 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n. 7 “Grandi apparecchiature”; n. 5 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;
- la linea di intervento **M6.C1 – 1.2.2** riguarda le Centrali Operative Territoriali (COT) di:
Agrigento via Esseneto, CUP C42C21002080006;
Canicattì via Pietro Micca, CUP C52C21001330006;
Licata via Santa Maria, CUP C62C21001960006;
Ribera, via Circonvallazione, CUP C92C21001950006;
 - in data 30/05/2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC, sulla scorta del POR, e l’impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel citato CIS, che costituiranno elementi prioritari ed essenziali per l’attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
 - con D.A. n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente come oggetto: *“Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale”*;
 - l’art. 1 del D.A. n. 664/22 delega l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in qualità di “Soggetto Attuatore esterno” a svolgere le attività relativamente ai 59 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR e, cioè: n. 19 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n. 3 “Ospedali di Comunità”; n. 21 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n. 7 “Grandi apparecchiature”; n. 5 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC, secondo gli standards contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
 - con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022 l’ASP di Agrigento ha proceduto all’individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;
 - con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1569 del 26 settembre 2022 l’ASP di Agrigento ha approvato il “Programma Triennale dei lavori pubblici dell’Azienda Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024”;

DATO ATTO:

- che il R.U.P. della procedura degli interventi di che trattasi è l’assistente tecnico geometra Mauro Miccichè, individuato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1631 del 04/10/2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett.a) punto 2,1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L.29/07/2021 n. 108 in modalità telematica mediante trattativa diretta, tramite MEPA, con l’utilizzo della piattaforma acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di “Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione” per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione

6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 *“Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”*, ad un professionista esterno iscritto all’Albo Unico Regionale dei professionisti istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/2011, per l’importo stimato di € 54.327,31 oltre oneri previdenziali (Inarcassa 4%) ed IVA al 22% ed è stato individuato l’Arch. Giuseppe Ciaccio C.F. CCCGPP69A29H743P - Partita IVA: 02046490849;

- che in data 13 ottobre 2022, nelle more della stipula del disciplinare d’incarico, si è proceduto alla consegna, in via d’urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di *“Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 “Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”* all’arch. Giuseppe Ciaccio, stante l’urgenza di avviare concretamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l’obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1945 del 25 novembre 2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio in epigrafe all’arch. Giuseppe Ciaccio che ha offerto il ribasso d’asta del 20,10% per un importo netto contrattuale di € 43.407,52 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2216 del 30 dicembre 2022 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) degli interventi riguardanti le 4 Centrali Operative Territoriali (COT) di Agrigento, Canicattì, Licata e Ribera, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute Componente 1 - linea C1-1.2.2;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 735 del 20 aprile 2023 è stata approvata l’autorizzazione a contrarre per l’Appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 *“Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”*: COT di: AGRIGENTO (CUP C42C21002080006), CANICATTI’ (CUP C52C21001330006), LICATA (CUP C62C21001960006) e RIBERA (CUP C92C21001950006) da espletarsi tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute M6.C1 – 1.2.2, riguardante le quattro Centrali Operative Territoriali di Agrigento, Canicattì, Licata e Ribera, applicando il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 1 c.3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con utilizzo del portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; con la citata deliberazione commissariale sono stati altresì, approvati i quadri economici delle quattro COT (Centrali Operative Territoriali);
- che lo svolgimento delle gare è avvenuto secondo le modalità proprie della gara telematica tramite piattaforma MEPA;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1069 del 13 giugno 2023 sono state approvate, ai sensi dell'art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le proposte di aggiudicazione, in favore degli operatori economici individuati a seguito dell'espletamento delle quattro gare sopra indicate;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1203 del 27/06/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace "dell'Appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali";
- che con riferimento alla COT di LICATA (CUP C62C21001960006), in favore dell'impresa SATIPELL s.r.l. con sede legale in Via A. De Gasperi n. 50 - 92026 Favara (AG) - P.IVA: 02688480843;
- che in data 28/06/2023, è stato sottoscritto il contratto sul MEPA, in forma di documento di stipula relativo alla RDO n. 3551235, per un importo complessivo di € 96.643,49;
- che il progetto esecutivo per la realizzazione della COT di **Licata** è stato redatto dall'arch. Salvatore Troisi, tecnico incaricato dall'operatore economico **SATIPELL s.r.l.**;
- che con parere tecnico del 19/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1- 1.2.2 - realizzazione degli interventi riguardanti la centrale operativa (COT) di LICATA - CUP: C62C21001960006 per l'importo complessivo di € 219.421,61 di cui € 154.541,48 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 5.275,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.958,12 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed 53.922,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con delibera del Commissario Straordinario n° 2329 del 22/12/2023 è stato approvato in linea tecnica ed amministrativa il progetto esecutivo dei lavori nell'ammontare complessivo di € 184.887,19;
- che i lavori sono stati consegnati in data 22/12/2023;
- che durante il corso dei lavori, a seguito di disposizione del R.U.P. prot. n. 40159 del 07/03/2024, si è disposta la sospensione dei lavori, in considerazione della concomitanza con i lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria, i quali sono propedeutici e contemporaneamente interferivano con i lavori in oggetto;
- che la ripresa dei lavori è avvenuta in data 09/04/2024;
- che in data 04/06/2024 è stato redatto un atto aggiuntivo al contratto per un importo maggiore di € 30.437,96 definendo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO

Voce	Importo	
A LAVORI		
A1) LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	149.265,57 €	
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.275,91 €	
A3) A dedurre ribasso sui lavori (20,95%)	31.271,14 €	
Tot. A) TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)	123.270,34 €	123.270,34 €
B CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1) Progettazione definitiva ed esecutiva	10.958,12 €	
B2) A dedurre ribasso progettazione definitiva ed esecutiva (33,00%)	2.295,73 €	
Tot. B) TOTALE Importo contrattuale progettazione (B1-B2)	8.662,39 €	8.662,39 €
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)

52.954,46 € 52.954,46 €
184.887,19 €

- che i lavori sono stati ultimati in data 21/06/2024;
- che in data 28/06/2024 è stato redatto lo Stato finale dei lavori, dal quale è risultato:

Ammontare dei lavori e somministrazioni al netto:	€ 122.683,45
A dedurre l'ammontare degli acconti corrisposti:	
1° Certificato di pagamento in data 26/02/2024	- € 16.959,84
2° Certificato di pagamento in data 25/07/2024	- € 105.110,19
resta il credito liquido dell'Impresa	€ 613,42

- che in data 26/07/2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs n.50/2016, liquidando all'Appaltatore il credito residuo di € 613,42 (diconsi euro seicentotredici/42), che sono state pagate all'appaltatore le somme a saldo per lavori eseguiti risultanti dallo stato finale dei lavori del 21/06/2024;
- che per quanto concerne le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva oggetto dell'appalto integrato sono state liquidate con Ordinativo n. 59 del 24/04/2024 all'operatore economico le somme riportate nel prospetto seguente:

Spese di progettazione, al netto	
Imponibile	€ 8.662,39
IVA (22%) calcolata su imponibile	€ 1.905,73
TOTALE	€ 10.568,12

- che per quanto concerne le spese per le prestazioni di redazione del PFTE, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza per l'esecuzione sono state liquidate le seguenti somme con Ordinativo n. 173 del 19/09/2024, a saldo:

Redazione PFTE, Direzione dei Lavori, CSE	
Imponibile	€ 7.993,73
Contributo integrativo INARCASSA (4%)	€ 319,75
IVA (soggetto in regime forfettario, esente)	€ 0,00
TOTALE	€ 8.313,48

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 406 del 27/02/2024 è stata disposta la spesa di €11.710,17 (di cui € 9.598,50 per imponibile e € 2.111,67 per I.V.A. al 22%) per la fornitura degli arredi;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 498 del 07/03/2024 è stata disposta la spesa di € 3.525,23 (di cui 2.889,53 per imponibile e € 635,70 per I.V.A. al 22%) per la fornitura della attrezzature informatiche;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1005 del 23/05/2024 è stata disposta la spesa di € 8.521,16 (di cui € 6.984,55 per imponibile e € 1.536,70 per I.V.A. al 22%) per la fornitura dei gruppi elettrogeni e gruppi di continuità;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 261 del 30/07/2024 è stato affidato l'incarico per la stesura della relazione di cui al meccanismo di verifica CE per il target PNRR M6C1 -7 "Centrali Operative Pienamente Funzionanti" all'ing. Sebastiano Amato dell'ARNAS Garibaldi per le 4 COT di competenza dell'ASP di Agrigento;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 511 del 20/09/2024 è stato stabilito che l'attività dell'ingegnere indipendente è assimilata a quella del collaudo tecnico-amministrativo

espletata da collaudatori interni e pertanto rientra nell'ambito degli incentivi tecnici e che l'importo fisso per ciascuna COT ammonta a euro 500,00;

- che gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) ammontano a € 2.070,37 (incluso il compenso per l'ingegnere indipendente) sono stati calcolati sulla base del prospetto di cui all'allegato 1;
- che il quadro economico, a consuntivo, risulta il seguente:

QUADRO ECONICO DI SPESA - CONSUNTIVO

A	LAVORI		
A1)	LAVORI ESEGUITI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	149.265,57	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.275,91	
A3)	A dedurre ribasso sui lavori (20,95%)	-31.271,14	
tot. A)	TOTALE Importo a consuntivo dei lavori (A1+A2-A3)	123.270,34	123.270,34
B	PROGETTAZIONE		
B1)	Progettazione definitiva ed esecutiva	10.958,12	
B2)	A dedurre ribasso progettazione definitiva ed esecutiva (20,95%)	-2.295,73	
Tot. B)	TOTALE Importo liquidato progettazione (B1-B2)	8.662,39	8.662,39
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.P. (compreso i relativi oneri previdenziali, al netto del ribasso d'asta)	11.285,96	
C2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 - 2% di A), incluso compenso ingegnere indipendente	2.070,37	
C3)	Attrezzature informatiche (UOC Provveditorato)	2.889,53	
C4)	Arredi (UOC Provveditorato)	9.598,50	
C5)	Gruppi elettrogeni (UOC Provveditorato)	3.246,32	
C6)	Versamenti ANAC (30,00/4 affid. PFTE + 35,00 gara app. integrato)	42,50	
C7)	Oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) sulla progettazione definitiva-esecutiva	1.981,95	
C8)	I.V.A. sui lavori eseguiti (22% di A)	27.119,47	
C9)	I.V.A. su arredi e attrezzature (22% di C3+C4+C5)	4.283,97	
Tot. C)	Totale somme a disposizione	66.256,80	66.256,80
	TOTALE SOMME PER REALIZZAZIONE INTERVENTO (A+B+C)		198.189,53
	A DEDURRE IMPORTO FINANZIAMENTO		-173.074,00
	MAGGIORE SOMMA A CARICO DELL'AZIENDA, OGGETTO DI FUTURA RIMODULAZIONE		25.115,53

DATO ATTO che con successiva delibera saranno liquidati gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) ed il compenso per l'ingegnere indipendente;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** di quanto riportato in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dell'appalto integrato per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Licata CUP C62C21001960006 – CIG 957984522F;
3. **APPROVARE** il quadro economico di spesa a consuntivo riportato in premessa;
4. **DARE ATTO** che la somma di € 25.115,53, necessaria per coprire le maggiori spese per la realizzazione dell'intervento rispetto all'importo del finanziamento di € 173.074,00, è stata anticipata dall'ASP di Agrigento utilizzando i fondi del bilancio aziendale, nelle more di procedere alla richiesta di rimodulazione dei finanziamenti a valere sulle risorse del PNRR per il recupero delle somme anticipate;
5. **TRASMETTERE** il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale della Salute-Dipartimento per la Pianificazione Strategica al fine di mantenere costantemente edotto il Soggetto Attuatore in merito all'iter del procedimento;
6. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;
7. **DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;
8. **DARE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole

Parere Favorevole

Data 22.11.24

Data 22.11.24

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Pucci



Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci




Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
~~"Ufficio Studi e Contratti di Gestione"~~
Dott.ssa Teresa Cinque



Appalto integrato per la realizzazione della COT di Licata					
Titolo appalto	Previsioni di progetto			IMPORTO A CONSUNTIVO	Percentuali fondo art. 113 DL50/2016
	PFTE		DEFINITIVO/ESECUTIVO		
Importo LAVORI O APPALTO INTEGRATO	127.106,92		165.499,60	165.499,60	
Fondo art 113 DL 50/2016	2.033,71		2.647,99	2.647,99	Comma 3 (80%)
	508,43		662,00	662,00	Comma 4 (20%)
	2.542,14		3.309,99	3.309,99	Totale

CodFunz	Attività	Fase	Percentuale teorica	Percent. interni	NO=0 SI=1	Perc. totale per funzione (teorica)	Perc. totale per funzione (interni)	economie prestaz. svolte da esterni	Incent. per interni, su importo PFTE	Incent. per interni, su importo ESECUTIVO	Totali incentivi per interni
A	Programmazione della spesa	progettazione	2,00%	2,00%	1	2,00%	2,00%	0,00	40,67		40,67
B	RUP	progettazione	12,50%	12,50%	1	25,00%	25,00%	0,00		331,00	331,00
		esecuzione	12,50%	12,50%	1			0,00		331,00	331,00
C	Verifica preventiva della progettazione	preliminare/PFTE	1,00%	1,00%	1	5,00%	5,00%	0,00	20,34		20,34
		Definitiva/ese cutiva	4,00%	4,00%	1			0,00			
D	Predispoz. procedure di gara	Progettazione	10,00%	10,00%	1	10,00%	10,00%	0,00		105,92	105,92
	Direttore Lavori		20,00%	0,00%	0			0,00		264,80	264,80
E	Ispettore Cantiere	Esecuzione	5,00%	0,00%	0	30,00%	0,00%	-529,60			0,00
	Assistente in cantiere		5,00%	0,00%	0			-132,40			0,00
	Collaudo/Certificato regolare esecuzione		5,00%	0,00%	0			-132,40			0,00
		Esecuzione	10,00%	0,00%	0	10,00%	0,00%	-264,80			0,00
F	Somma per Ingegnere indipendente	Con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 511 del 20/09/2024 è stato stabilito che: - l'attività dell'ingegnere indipendente è assimilata a quella del collaudo tecnico-amministrativo espletata da collaudatori interni e pertanto rientra nell'ambito degli incentivi tecnici; - l'importo fisso per ciascuna COT ammonta a euro 500,00								500,00	500,00
G	Collaboratori tecnici e amm.vi	Progettazione	10,00%	10,00%	1	18,00%	18,00%	0,00			264,80
		Esecuzione	8,00%	8,00%	1	100,00%	60,00%	0,00			211,84
								-1.059,20			2.070,37

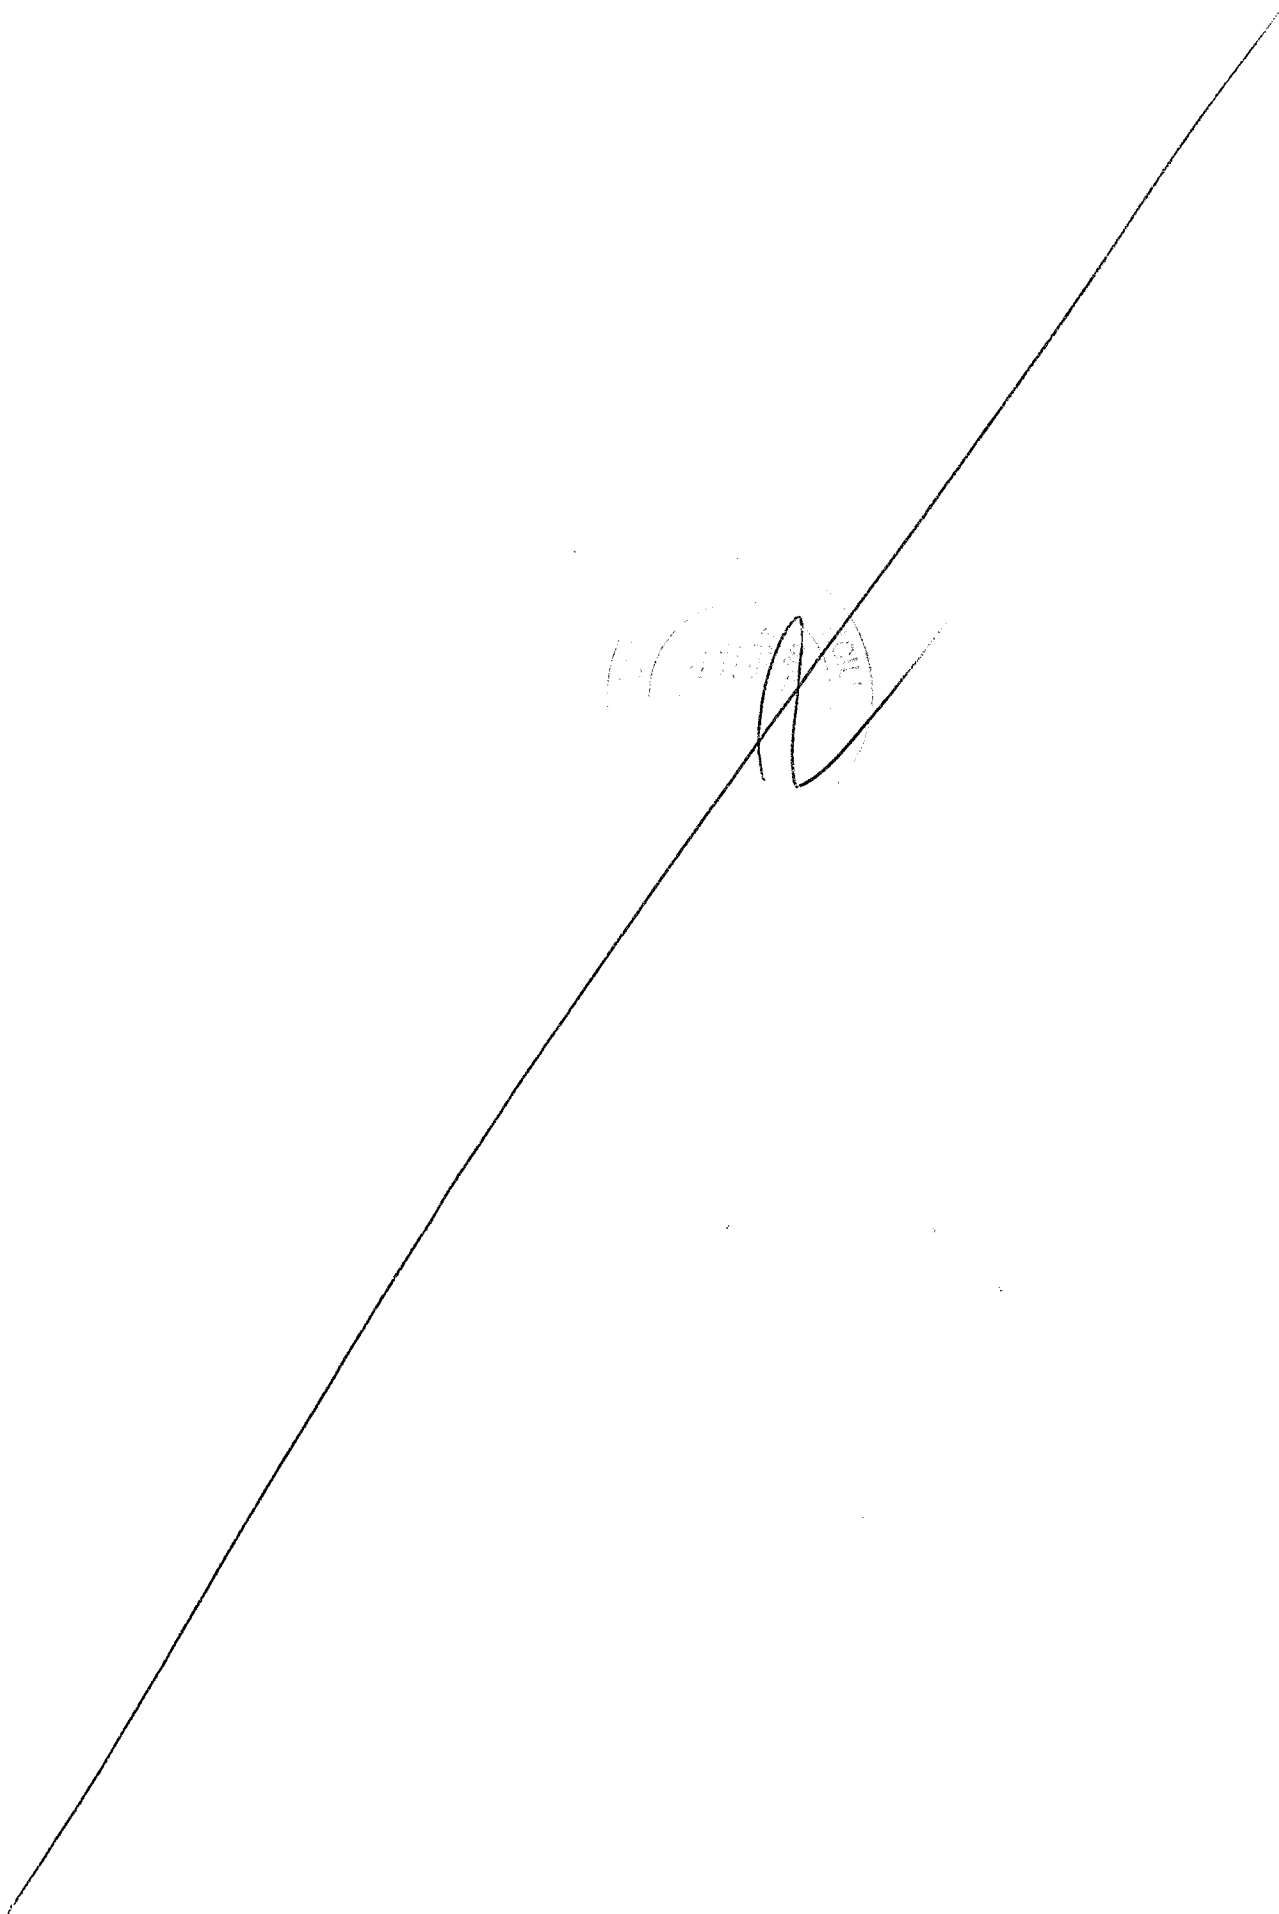

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

☒ Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal 06-12-2024

- Immediatamente esecutiva dal _____
Agrigento, li 22 NOV. 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO
Coadiutore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi
